



TELÊMACO BORBA

P R E F E I T U R A

Uma nova cidade a cada dia

OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE EMPREITADA POR VALOR GLOBAL

Setembro-2023



TELÊMACO BORBA

P R E F E I T U R A

Uma nova cidade a cada dia

Sumário

Construção do Novo Terminal Rodoviário	3
Complexo de Lazer da Área 3.	4
Reforma e Ampliação da UBS Triângulo.	5
Reforma e Ampliação do Cmei Vinicius de Moraes.	6
Construção do Centro de Logística da SME.	7
Revitalização da Praça Dr. Horácio Klabin.	8



TELÊMACO BORBA

P R E F E I T U R A

Uma nova cidade a cada dia

Descrição da Obra	Construção do Novo Terminal Rodoviário.
Empresa Contratada	Paulo Cezar de Oliveira Ferreira Eireli.
Órgão Gestor	SMTIC.
Fiscal Técnico	Engº Civil Andrei Crystian Vieira.
Valor Original de Contrato	R\$3.519.580,11.
Aditivos e Reequilíbrios	R\$197.574,85.
Início	10-ago-22.
Conclusão Prevista	31-dez-23.
% de Execução Financeira	27,87%.
Valor Pago	R\$980.713,571.
Condição Atual	Em andamento.
Observações	----- .






Descrição da Obra	Complexo de Lazer da Área 3.
Empresa Contratada	Paulo Cezar de Oliveira Ferreira Eireli.
Órgão Gestor	SMCER.
Fiscal Técnico	Engº Civil Andrei Crystian Vieira.
Valor Original de Contrato	R\$528.957,17.
Aditivos e Reequilíbrios	----- .
Início	14-dez-22.
Conclusão Prevista	31-dez-23.
% de Execução Financeira	46,21%.
Valor Pago	R\$241.180,32
Condição Atual	Em andamento.
Observações	----- .






Descrição da Obra	Reforma e Ampliação da UBS Triângulo.
Empresa Contratada	O.S. Souza & Souza EPP.
Órgão Gestor	SMS.
Fiscal Técnico	Engº Civil Luiz Tadeu Gomes Santos.
Valor Original de Contrato	R\$ 696.245,20.
Aditivos e Reequilíbrios	----- .
Início	02-mar-23.
Conclusão Prevista	02-out-23.
% de Execução Financeira	51,54%.
Valor Pago	R\$ 358.830,52.
Condição Atual	Em andamento.
Observações	----- .

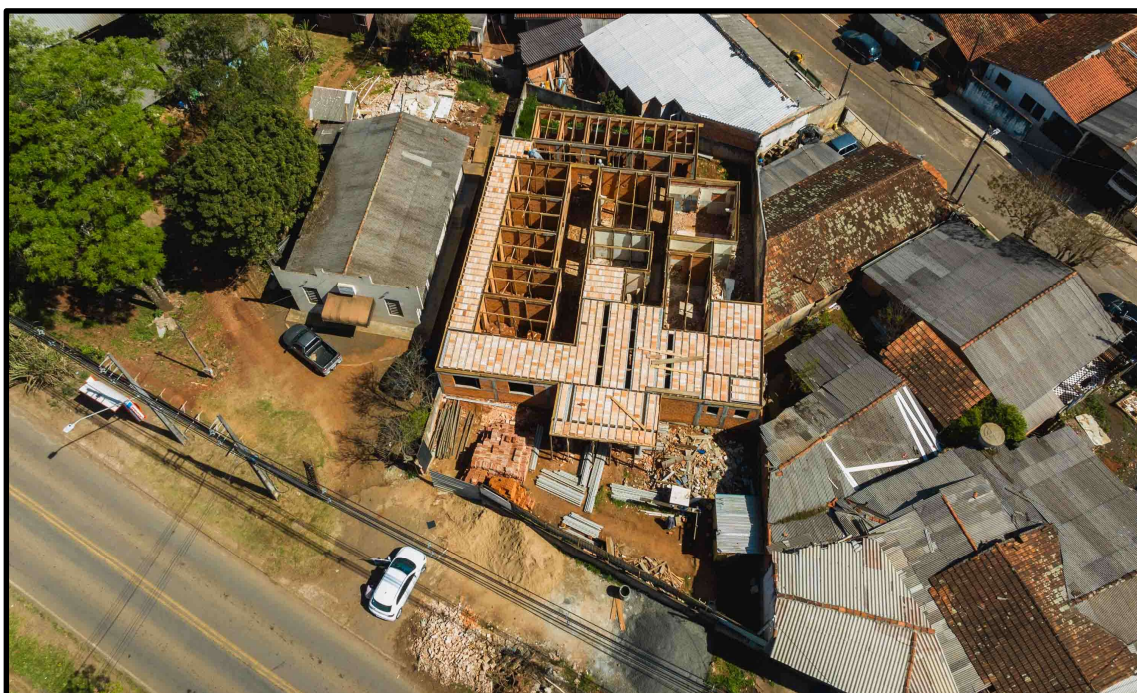



Descrição da Obra	Reforma e Ampliação Cmei Vinicius de Moraes.
Empresa Contratada	C&Z Engenharia Ltda.
Órgão Gestor	SME.
Fiscal Técnico	Engº Civil Leonardo Canova Lima.
Valor Original de Contrato	R\$1.622.290,28.
Aditivos e Reequilíbrios	----- .
Início	26-jan-23.
Conclusão Prevista	26-jan-24.
% de Execução Financeira	26,97%.
Valor Pago	R\$473.507,13.
Condição Atual	Em andamento.
Observações	----- .

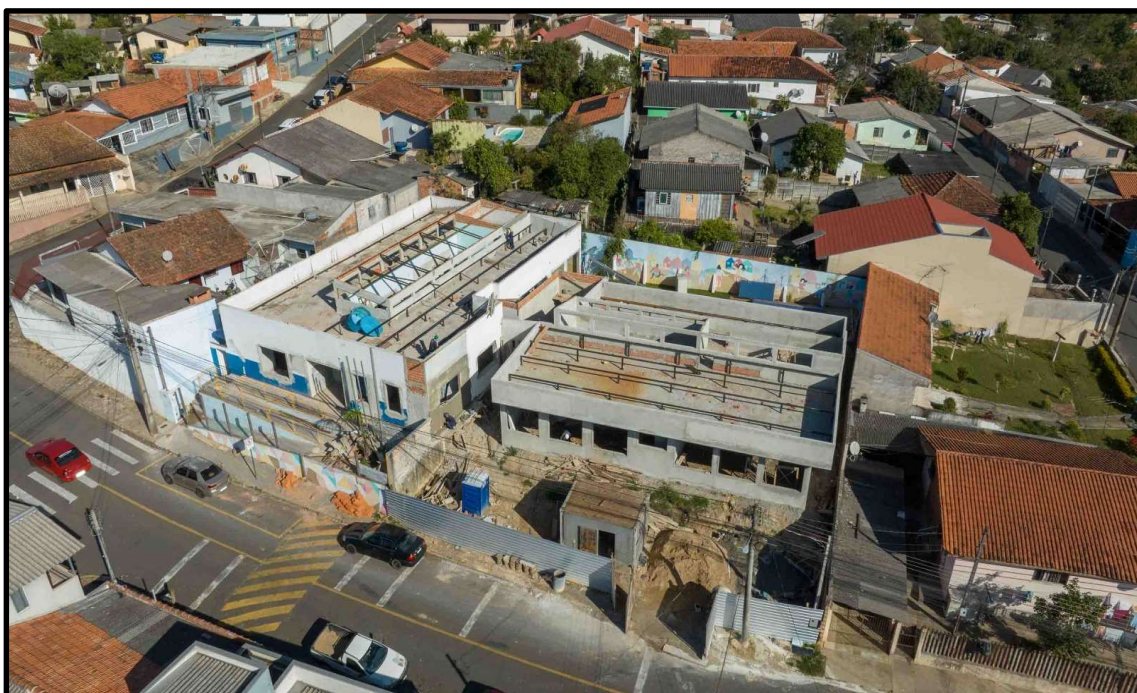



TELÊMACO BORBA

P R E F E I T U R A

Uma nova cidade a cada dia

Descrição da Obra	Construção do Centro de Logística da SME.
Empresa Contratada	O.S. Souza & Souza EPP.
Órgão Gestor	SME.
Fiscal Técnico	Engº Civil Leonardo Canova Lima.
Valor Original de Contrato	R\$2.783.357,47.
Aditivos e Reequilíbrios	----- .
Início	03-mar-23.
Conclusão Prevista	03-nov-23.
% de Execução Financeira	19,65%.
Valor Pago	R\$546.946,05.
Condição Atual	Em andamento.
Observações	----- .





Descrição da Obra	Revitalização da Praça Dr. Horácio Klabin.
Empresa Contratada	C&Z Engenharia Ltda.
Órgão Gestor	SMCER.
Fiscal Técnico	Engº Civil Andrei Crystian Vieira.
Valor Original de Contrato	R\$3.953.503,40.
Aditivos e Reequilíbrios	----- .
Início	01-set-23.
Conclusão Prevista	01-mai-24.
% de Execução Financeira	0,00%.
Valor Pago	R\$0,00.
Condição Atual	Em andamento.
Observações	----- .

